


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen	Text1	03 Mai '21							10 Mai '21			
								M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	
1	Münster	39 Tage	Die 25.05.21	Fre 16.07.21														
2																		
3																		
4	Elisabethenstraße	4 Tage	Die 25.05.21	Fre 28.05.21		Team1												
5	Am Philippseck	3 Tage	Mon 07.06.21	Mit 09.06.21		Team2												
6	Am Schloßwall	5 Tage	Mon 31.05.21	Fre 04.06.21	4	Team1												
7	Am Schlossberg	6 Tage	Fre 02.07.21	Fre 09.07.21	14	Team2												
8	Landgrafenweg	3 Tage	Mon 07.06.21	Mit 09.06.21	6	Team1												
9	Am Schloss Wingert	3 Tage	Mon 12.07.21	Mit 14.07.21	7	Team2												
10	Isselbachgasse	3 Tage	Don 10.06.21	Mon 14.06.21	8	Team1												
11																		
12	An der Münsterkirche / Maibacherstraße /	6 Tage	Don 10.06.21	Don 17.06.21	5	Team2	230m Vollsperrung											
13	Backgasse	10 Tage	Die 15.06.21	Mon 28.06.21	10	Team1												
14	Im kleinen Brühl	4 Tage	Mon 28.06.21	Don 01.07.21	16	Team2												
15	Räderweg/ Auf den Wolfsäckern	8 Tage	Die 29.06.21	Don 08.07.21	13	Team1												
16	Maibacherstraße	6 Tage	Fre 18.06.21	Fre 25.06.21	12	Team2												
17	Maibacherweg	6 Tage	Fre 09.07.21	Fre 16.07.21	15	Team1												
18	Oberer Köppelweg	4 Tage	Don 15.07.21	Die 20.07.21	9	Team2												
19	Unterer Köppelweg	4 Tage	Mon 19.07.21	Don 22.07.21	17	Team1												


Projekt: BZP Münster2
Datum: Fre 28.05.21

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

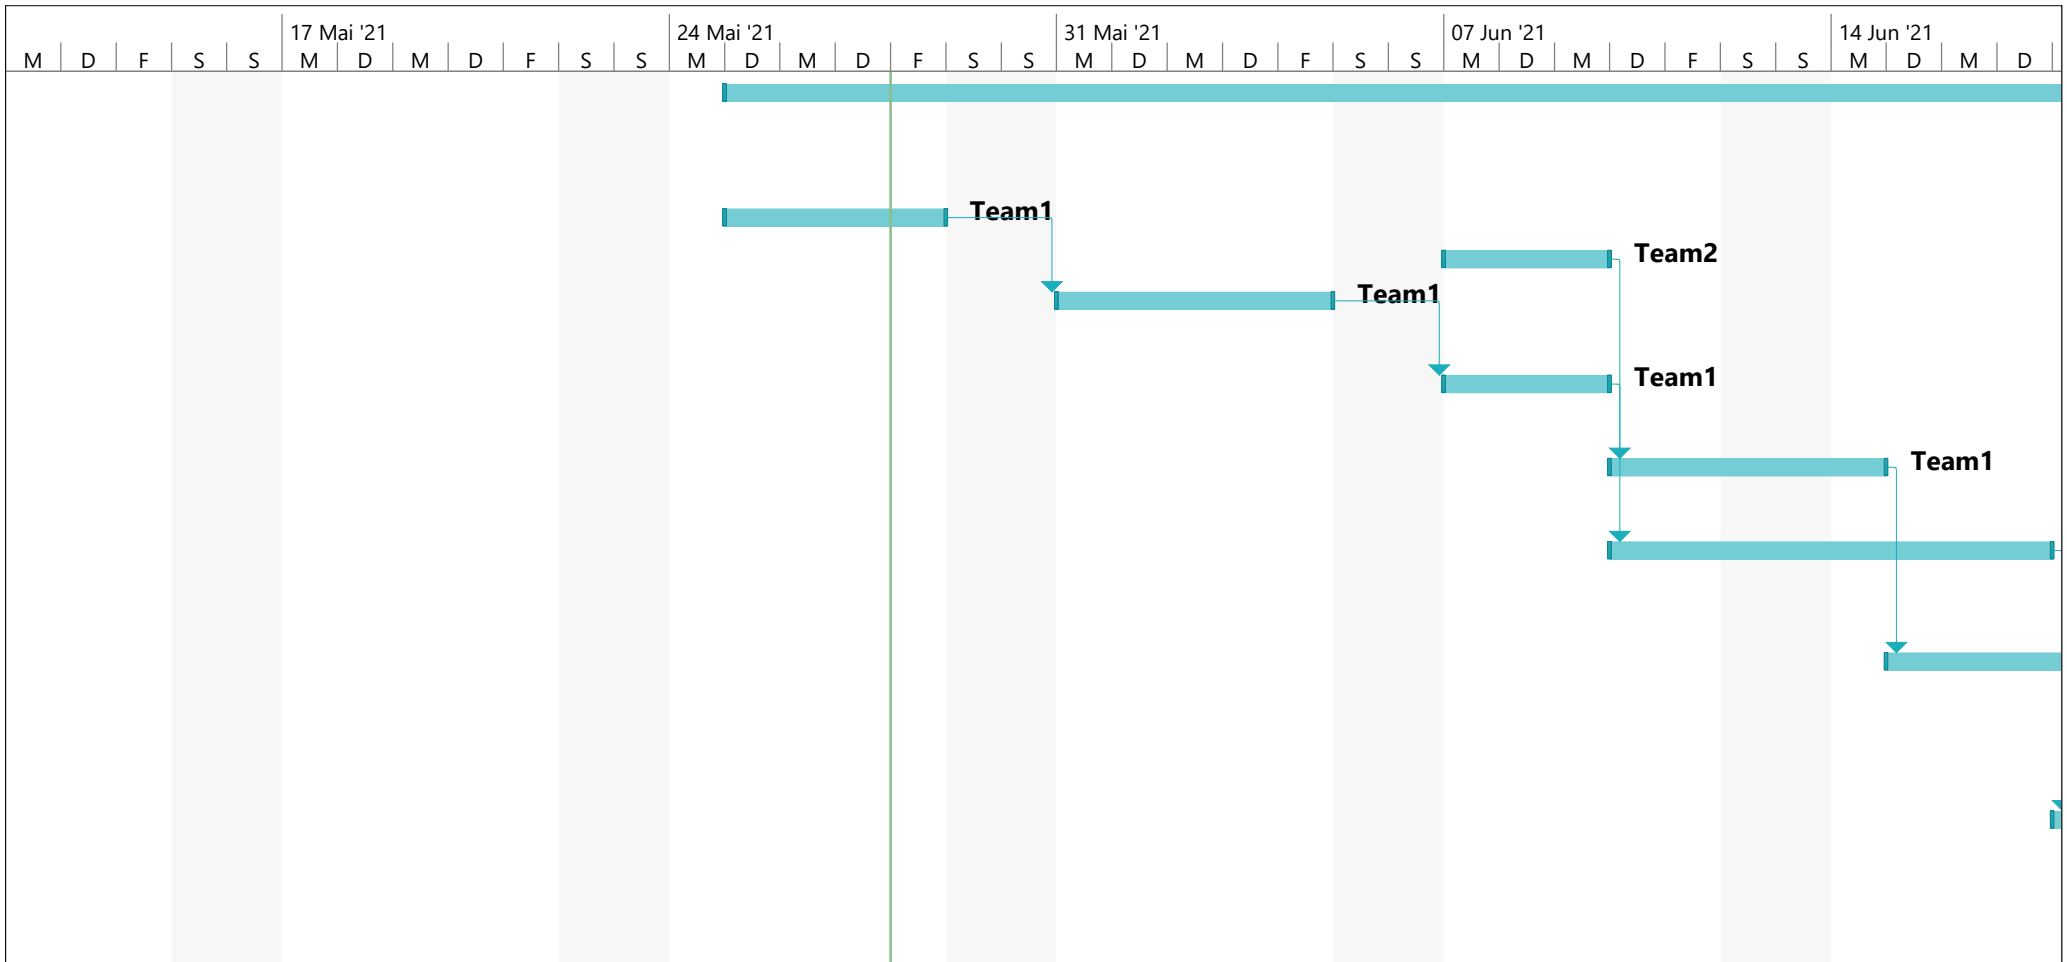

Project: BZP Münster2
 Datum: Fre 28.05.21

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			

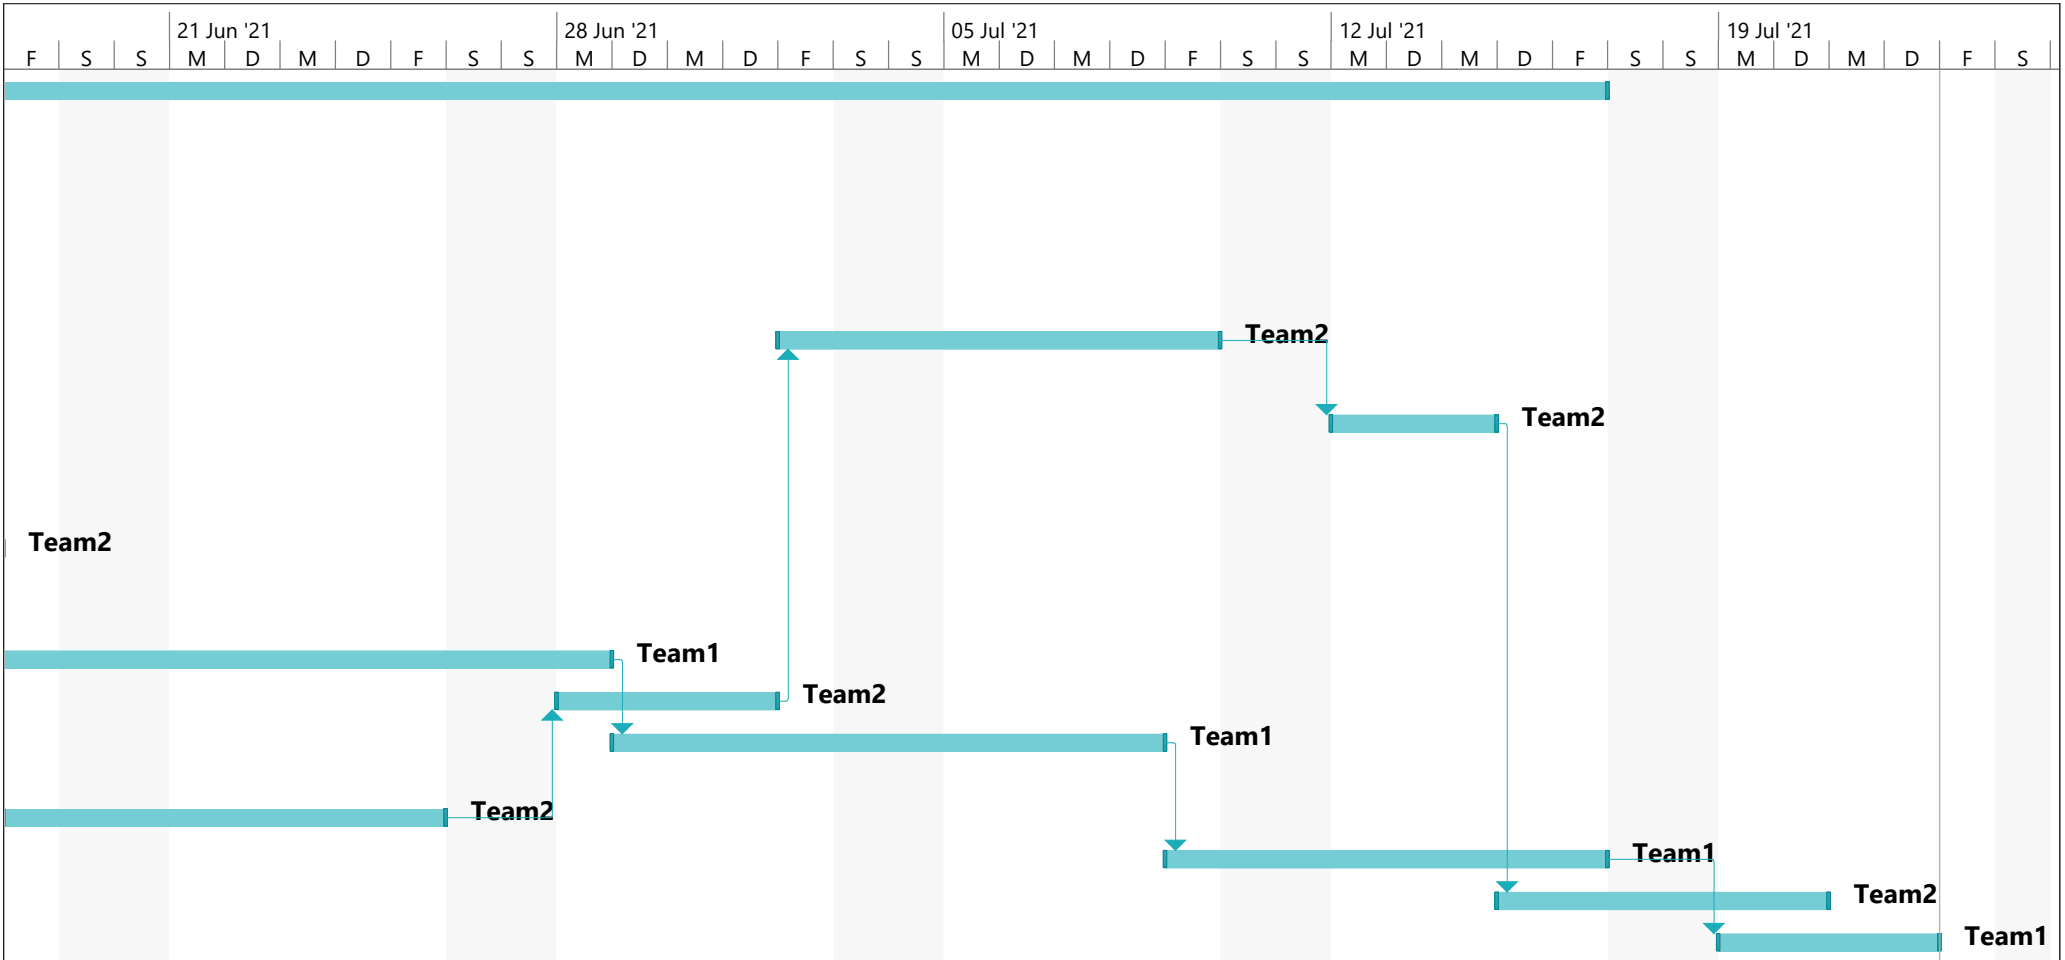

Project: BZP Münster2
 Datum: Fre 28.05.21

Vorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Externe Vorgänge	
Unterbrechung		Manueller Vorgang		Externer Meilenstein	
Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Sammelvorgang		Manueller Fortschritt	
Inaktiver Vorgang		Nur Anfang			
Inaktiver Meilenstein		Nur Ende			
